

Présentation de l'état d'avancement des projets du Programme Sino-Congolais

REUNION D'EVALUATION AVEC LE FMI_SEPTEMBRE 2025

Dominique MULUMBA
DIRECTEUR DES PROJETS/ACGT

0. Plan de l'exposé

1. Contexte du programme et présentation de l'historique des financements
2. Parties prenantes au programme et processus de facturation
3. Etat d'avancement global et par tranche de financement jusqu'en 2025
4. Quelques images illustratives des travaux en cours



I. Contexte et présentation de l'historique des financements

Mise en œuvre des objectifs des parties en termes des projets d'infrastructures (2008 à 2019)

- > 822 millions USD mise en œuvre en projets d'infrastructures

Mise en œuvre des objectifs des parties en termes des projets d'infrastructures (2019 à 2023)


- Disponibilité d'un financement de 150 millions USD

14 mars 2024 signature de l'avenant N°5

- Rien que pour 2024, la RDC devrait bénéficier de 624 millions USD en deux tranches (janvier et mai 2024). Et **324 millions USD/an** de 2025 à 2040 (15 ans).

Jusqu'en décembre 2025, le financement disponible pour les infrastructures est de **1,098 milliards USD (150+300+324+324)** et de **1017 millions USD (150+300+324+243)** jusqu'à la fin du Trimestre 3 de 2025

II. Parties prenantes au programme et processus de facturation

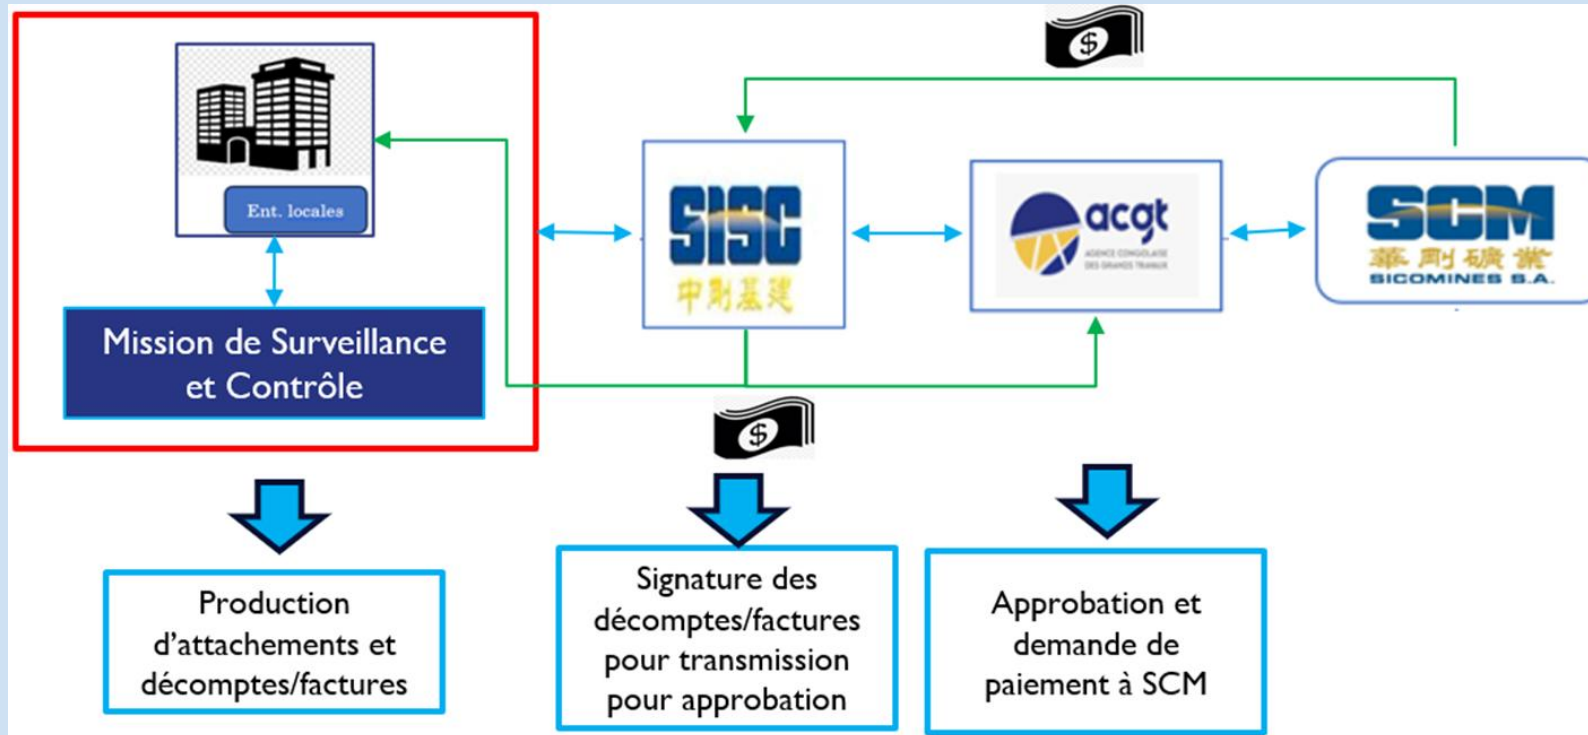

Processus de facturation

25^{ème} j du mois N : Début Harmonisation et production des décomptes et transmission à SISC SA (**Ese, Mission mixte de contrôle et surveillance**)

5^{ème} j du mois N+1 : Début validation des décomptes et transmission à l'ACGT (**SISC**)

7^{ème} au 12^{ème} j du mois N+1 : Approbation des décomptes et demande de paiement à SICOMINES (**ACGT**)

13^{ème} au 25^{ème} j du mois N+1 : Début processus de paiement à SISC **SICOMINES**

Délai de paiement à SISC = 30 jours

II. Parties prenantes au programme et processus de facturation



Processus de facturation

25^{ème} j du mois N : Début Harmonisation et production des décomptes et transmission à SISC SA (**Ese, Mission mixte contrôle et surveillance**)

5^{ème} j du mois N+1 : Début validation des décomptes et transmission à l'ACGT (**SISC**)

7^{ème} au 12^{ème} j du mois N+1 : Approbation des décomptes (**ACGT**)

13^{ème} et 14^{ème} J du mois N+1 : demande de paiement à SICOMINES (**APCSC**)


15^{ème} et 16^{ème} J du mois N+1 : Avis de Non Objection et transmission à SICOMINES (**Min Fin**)

17^{ème} au 30^{ème} j du mois N+1 : Début processus de paiement à SISC **SICOMINES**


Délai de paiement à SISC = 35 jours

III. Etat d'avancement selon les tranches de financement

Budget tranche de 150 millions USD

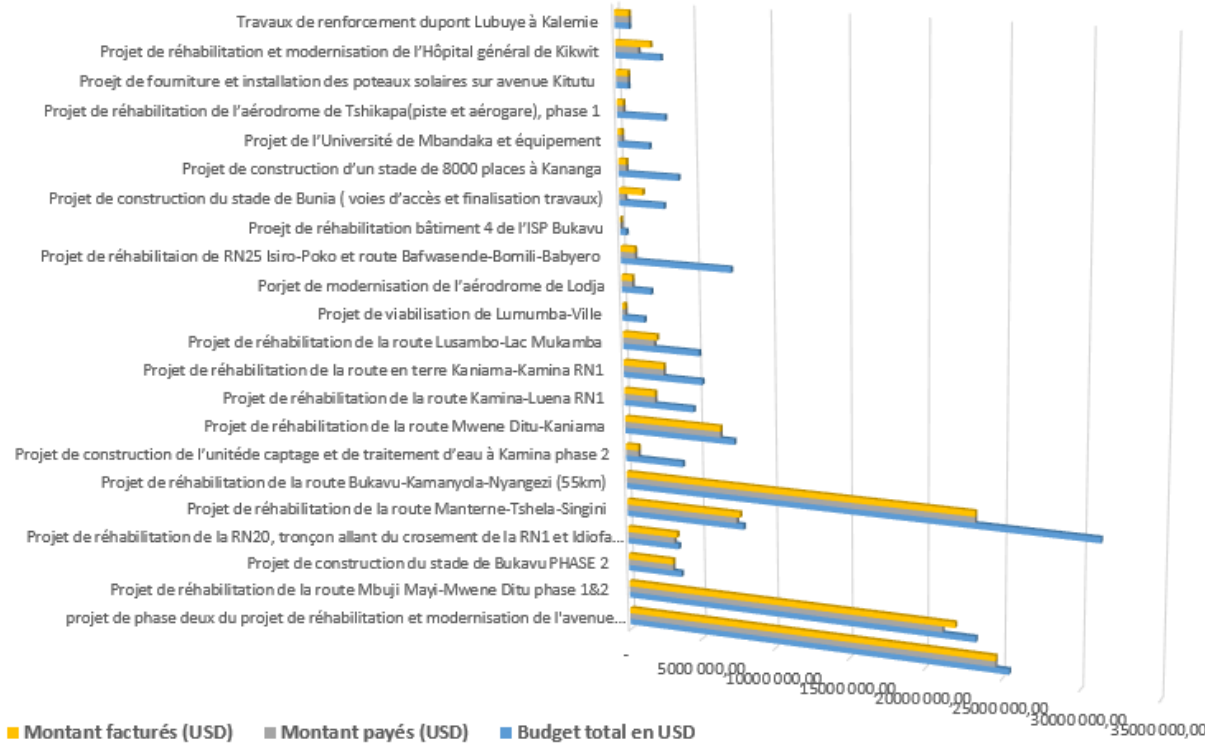


BUDGET TRANCHE DE 150 MILLIONS USD

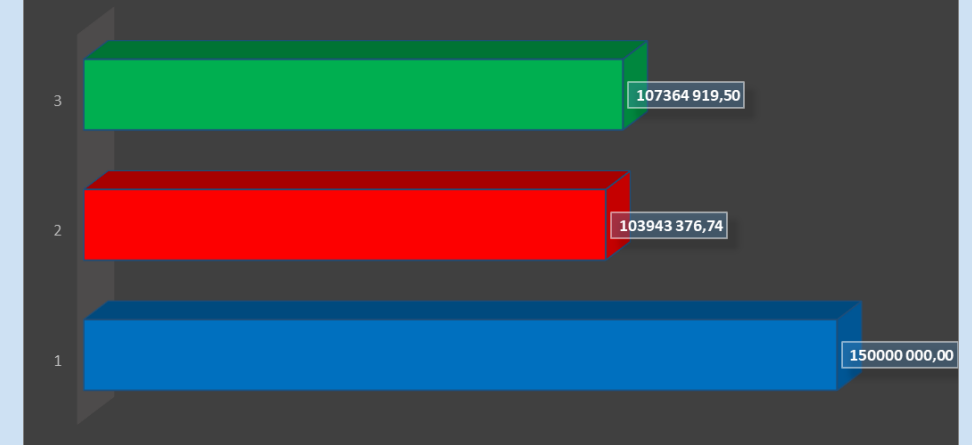


Détails financiers	Budget	Facturation	Décaissement
Montants réalisés	150000000	107 364 919,50	103 943 376,74
Ecarts constatés		42 635 080,50	46 056 623,27
Taux de réalisation		71,58%	69,30%

III. Etat d'avancement selon les tranches de financement

Budget Tranche de 324 millions USD (2024)

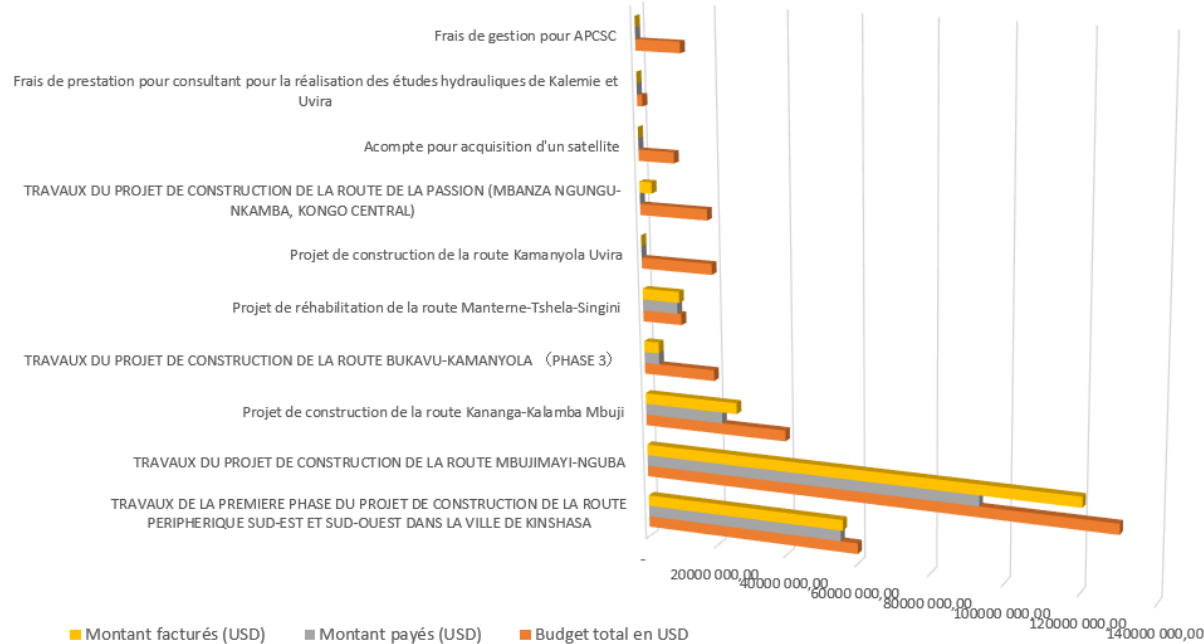


BUDGET TRANCHE DE 324 MILLIONS USD (2024)

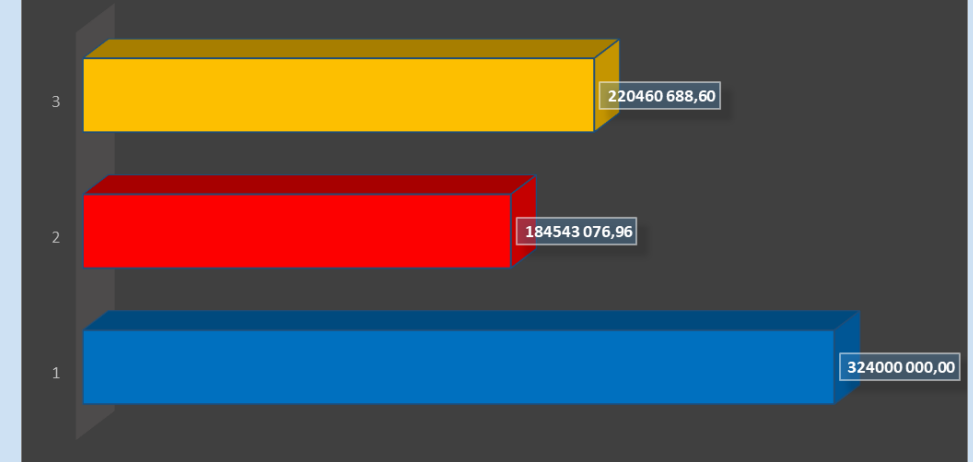


Détails financiers	Budget	Facturation	Décaissement
Montants réalisés	324 000 000,00	220 460 688,60	184 543 076,96
Ecart constatés		103 539 311,40	139 456 923,04
Taux de réalisation		68,04%	56,96%

III. Etat d'avancement selon les tranches de financement

Budget Tranche de 300 millions USD (2024)

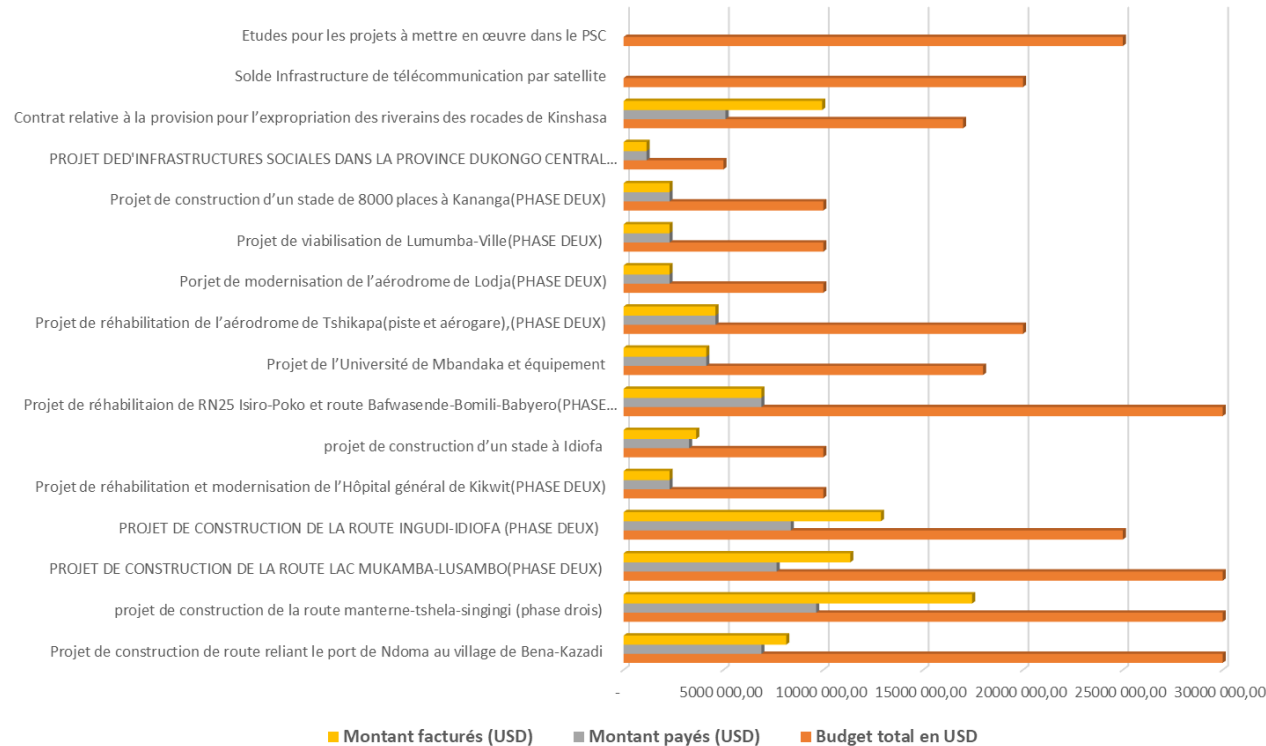


BUDGET TRANCHE DE 300 MILLIONS USD (2024)

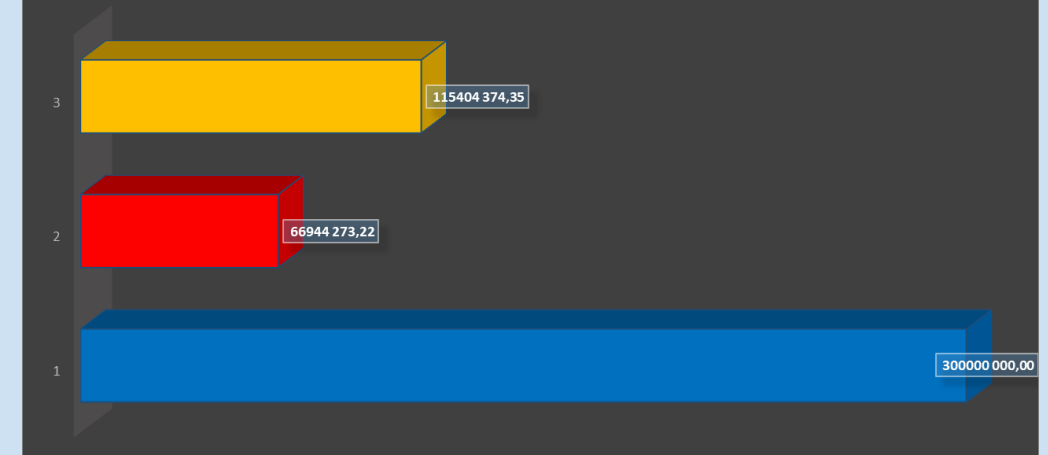


Détails financiers	Budget	Facturation	Décaissement
Montants réalisés	300 000 000,00	115 404 374,35	66 944 273,22
Ecart constatés		184 595 625,65	233 055 726,78
Taux de réalisation		38,47%	22,31%

III. Etat d'avancement selon les tranches de financement

Budget Tranche de 324 millions USD (2025)

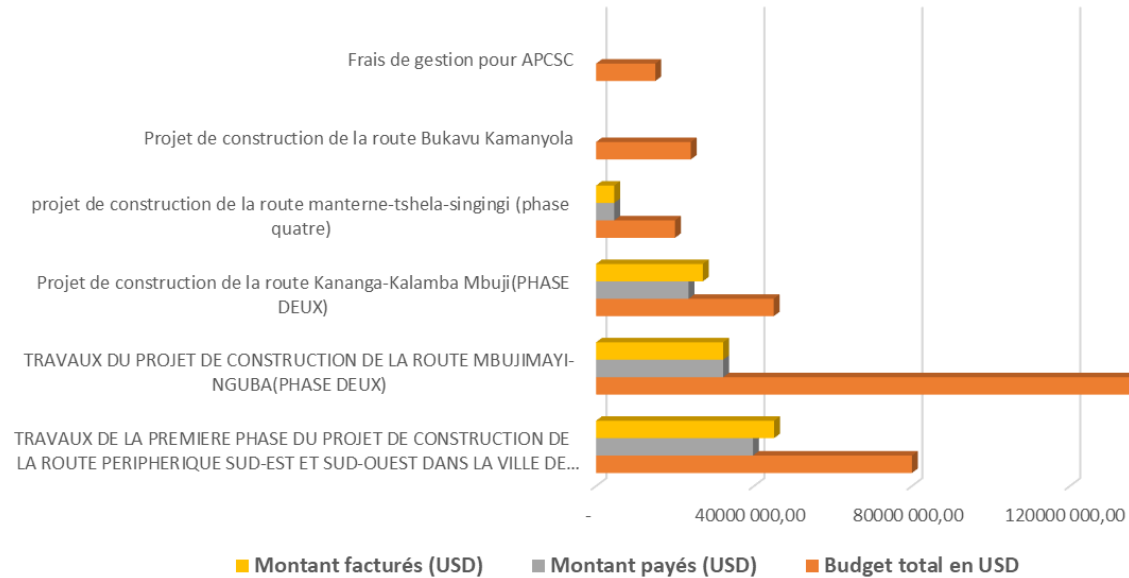


BUDGET TRANCHE DE 324 MILLIONS USD (2025)

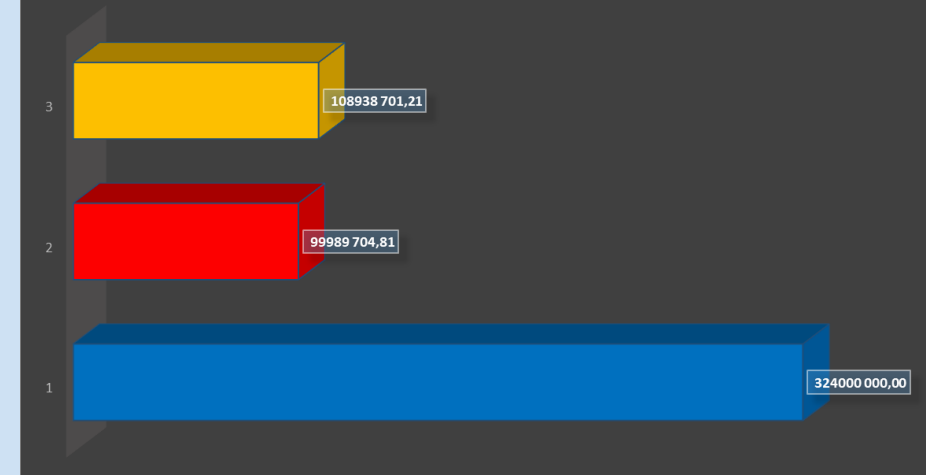

Détails financiers	Budget	Facturation	Décaissement
Montants réalisés	324 000 000,00	108 938 701,21	99 989 704,81
Ecart constatés		215 061 298,79	224 010 295,19
Taux de réalisation		33,62%	30,86%

III. Etat d'avancement selon les tranches de financement


ETAT D'AVANCEMENT GLOBAL SEPTEMBRE 2025

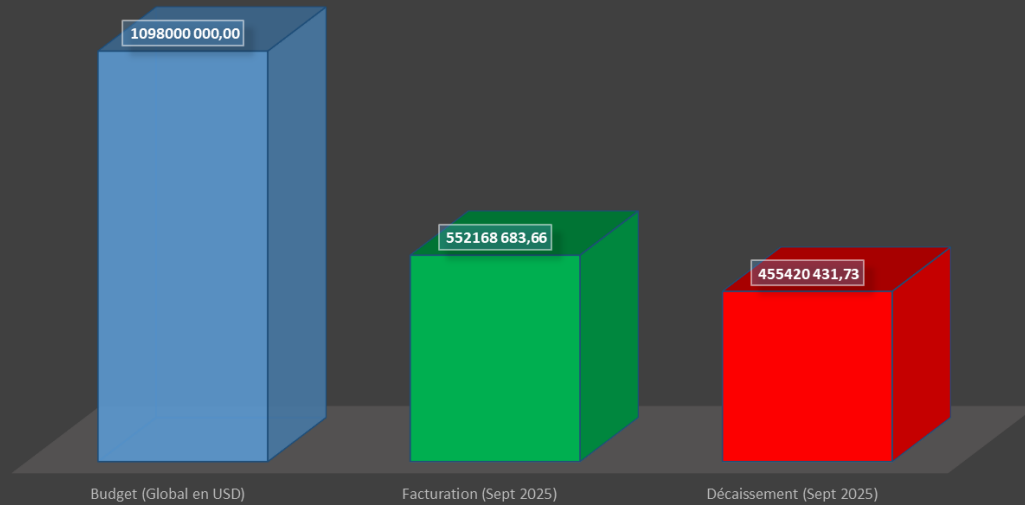

Détails financiers Global	Budget (Global en USD)	Facturation (Sept 2025)	Décaissement (Sept 2025)
Montants réalisés Budget 2022	150 000 000,00	107 364 919,50	103 943 376,74
Montants réalisés Budget 2024	324 000 000,00	220 460 688,60	184 543 076,96
Montants réalisés Budget 2024	300 000 000,00	115 404 374,35	66 944 273,22
Montants réalisés Budget 2025	324 000 000,00	108 938 701,21	99 989 704,81
TOTAL	1 098 000 000,00	552 168 683,66	455 420 431,73
Taux de réalisation		50,29%	41,48%
Ecart Sept. et Avr			

III. Etat d'avancement selon les tranches de financement

ETAT D'AVANCEMENT GLOBAL COMPARÉ

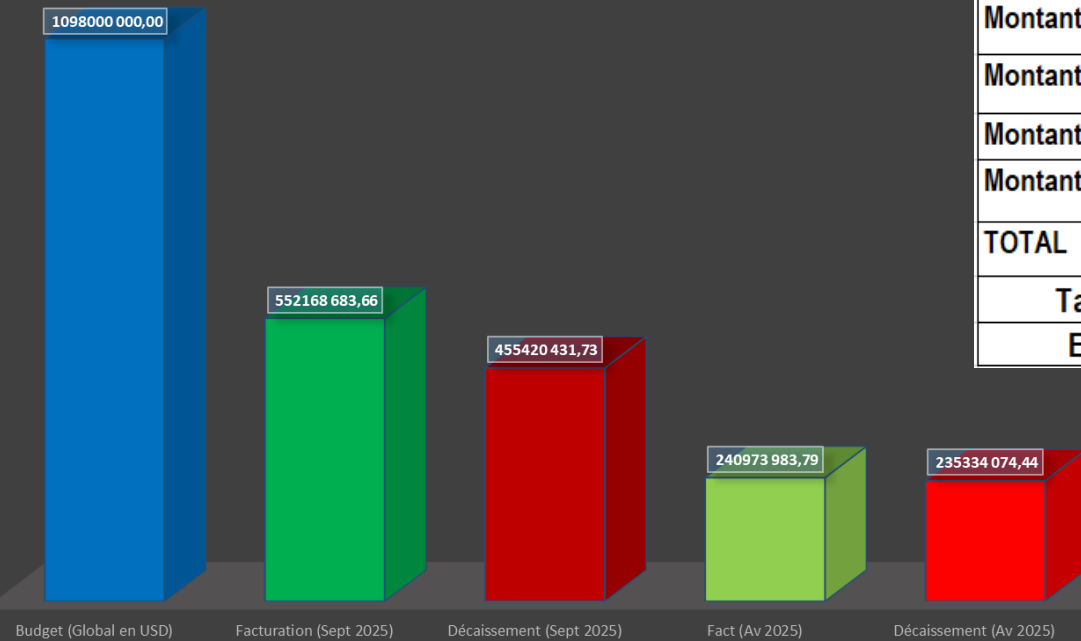

Début tardive de mise en œuvre des projets (Aout 2024)


Réaffectation de **100,841 millions USD** des projets dans la zone affectée par l'insécurité;

Réaffectation des fonds (**30 millions USD**) destinées aux infrastructures de télécommunications par satellite

Projets exécutés par les Entreprises Congolaises commencé tardivement en 2025

IV. QUELQUES IMAGES DES PROJETS ET EXECUTIONS PHYSIQUES


Rocades Sud-Ouest : 21,38 Km (Avancement physique)

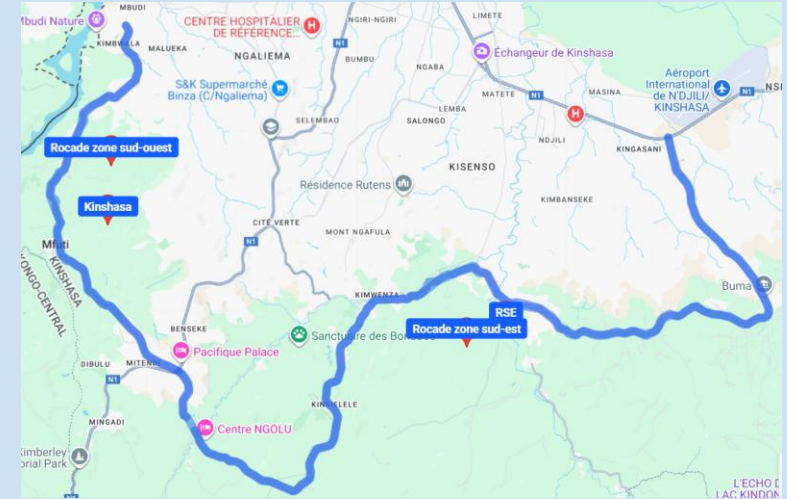

Chaussées: 47.57%

Répartition par nature de travaux (chaussées)

- Plateforme: 62.73%
- Couche de fondation: 53.66%
- Couche de base: 51.93%
- Couche d'imprégnation: 40.31%
- Enduit bicouche: 38.40%
- Couche de roulement en béton bitumineux: 38.40%

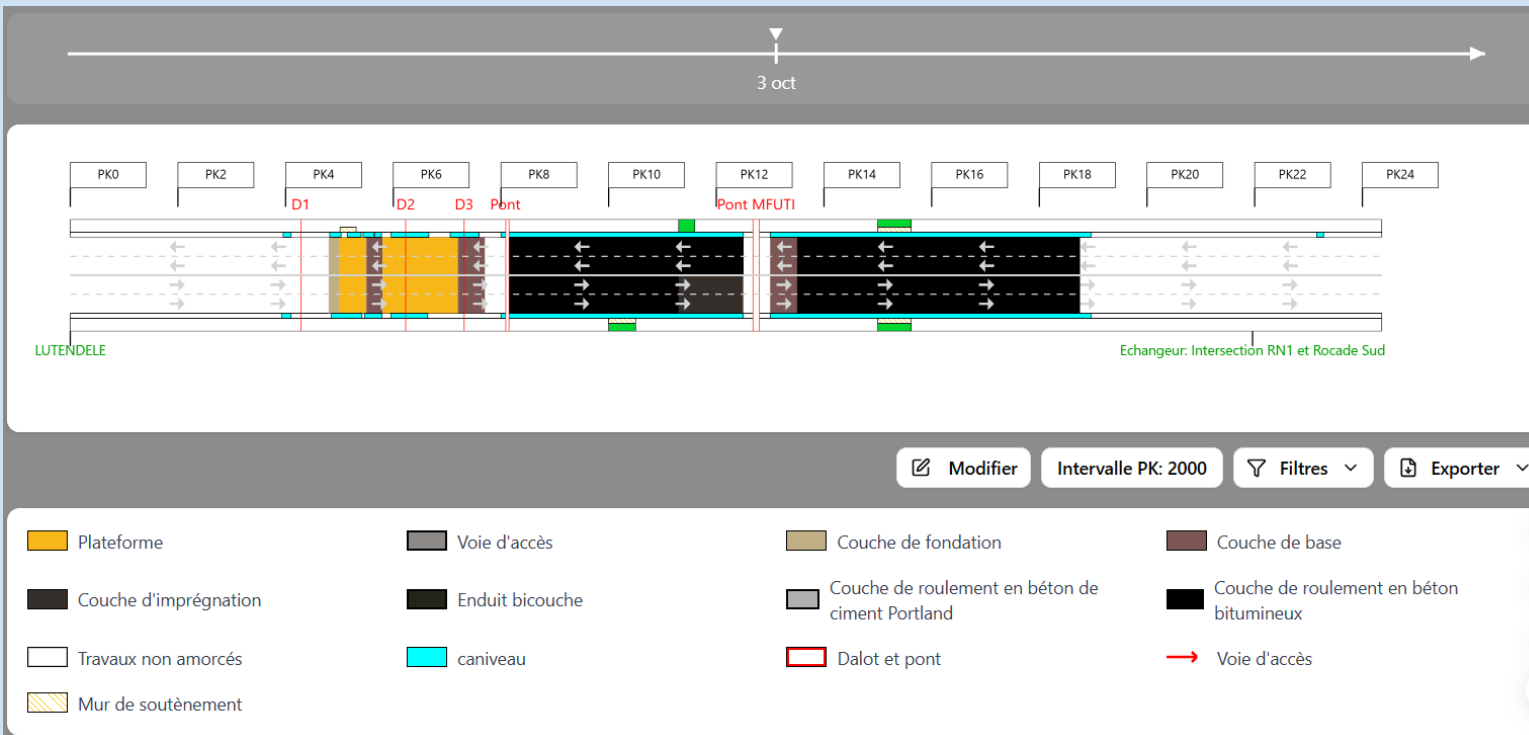



IV. QUELQUES IMAGES DES PROJETS ET EXECUTIONS PHYSIQUES

Rocades Sud-Est : 52,1 Km (Avancement physique)



IV. QUELQUES IMAGES DES PROJETS ET EXECUTIONS PHYSIQUES

Rocades Sud-Est : 52,1 Km (Avancement physique)

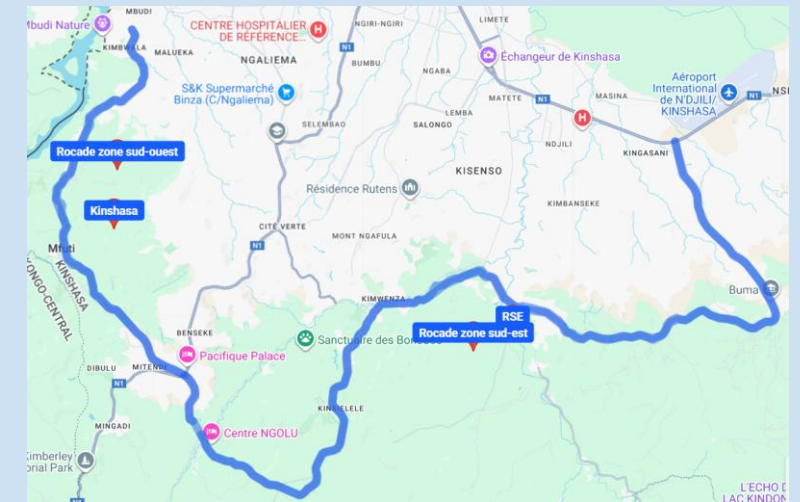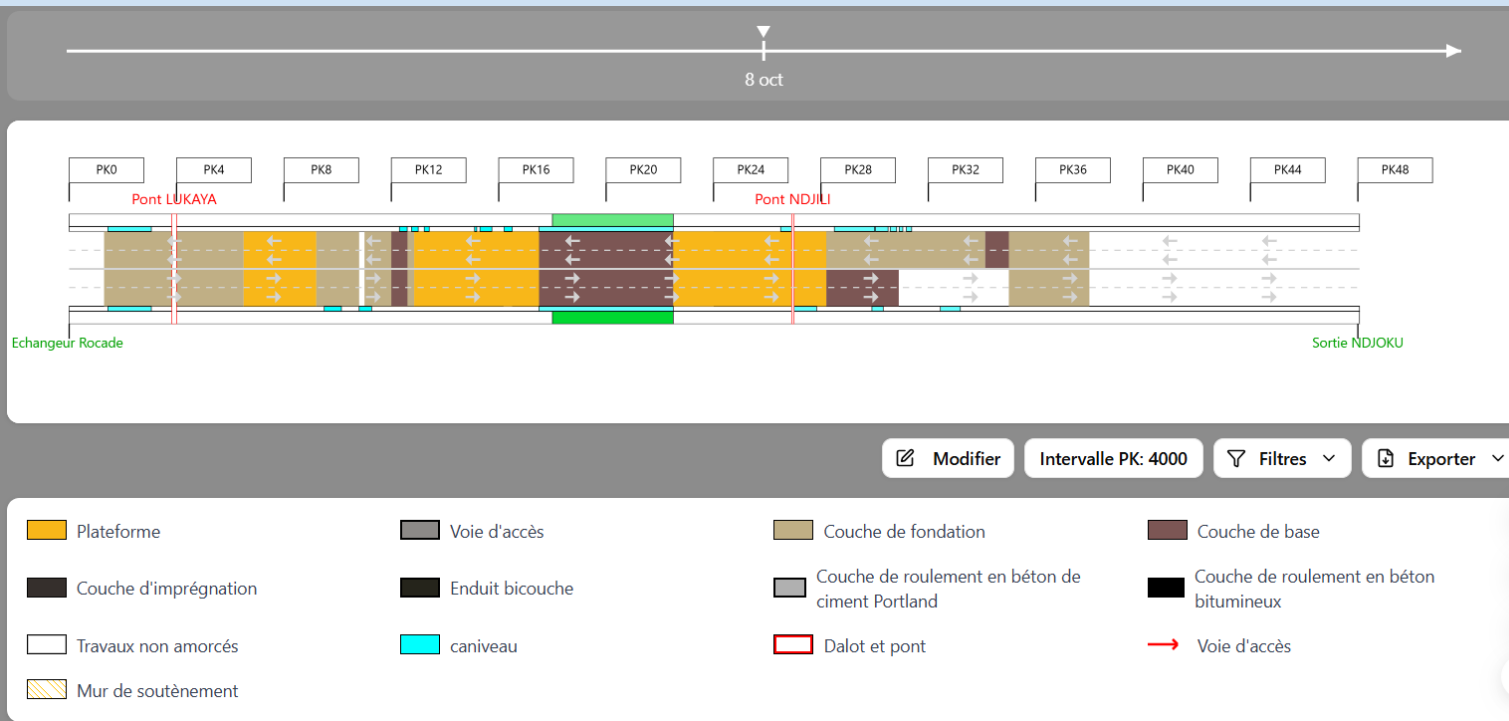

Chaussées: 25.84%

Répartition par nature de travaux (chaussées)

- Plateforme: 83.52%
- Couche de fondation: 56.37%
- Couche de base: 15.15%
- Couche d'imprégnation: 0.00%
- Enduit bicouche: 0.00%
- Couche de roulement en béton bitumineux: 0.00%

IV. QUELQUES IMAGES DES PROJETS ET EXECUTIONS PHYSIQUES

Rocades Sud-Est : 52,1 Km (Avancement physique)



RSE : Traitement de l'Erosion du PK34



RSE : Etat moyen de la route (couche de base)

III. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Echangeur (Avancement physique)
Estimé à **12 %**



III. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX


Avancement financier

Estimé à **25 %**


Avancement physique

Estimé à **36,38 %** (**144 036 000 USD**) Budget actuellement transmis à SICOMINES : 200 millions USD

EXÉCUTION FINANCIÈRE

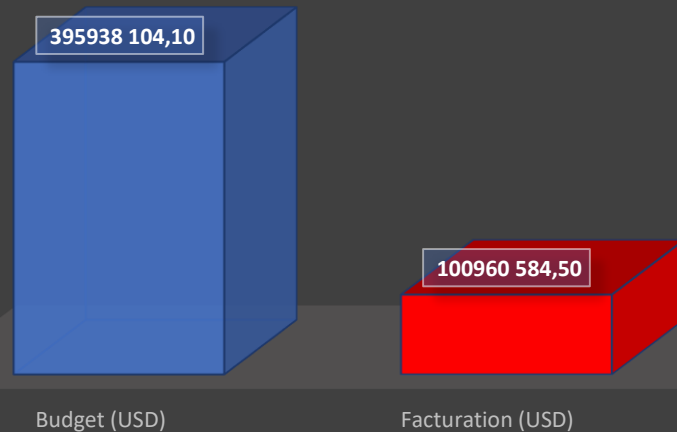

SITUATION GLOBAL PROJET DES ROCADES

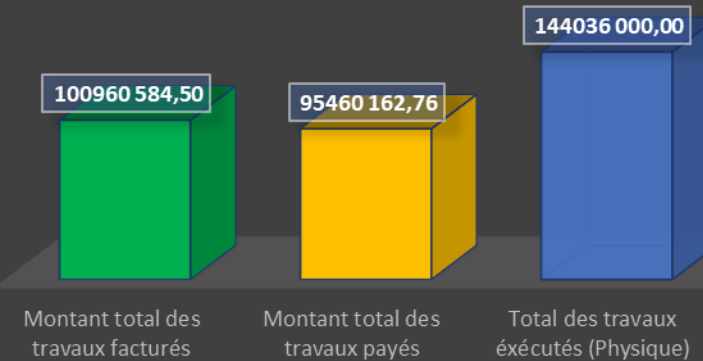



MINISTÈRE
DES INFRASTRUCTURES
ET TRAVAUX PUBLICS



Agence de
Pilotage, de
Coordination et de
Suivi des
Conventions de collaboration



MERCI pour votre attention
